

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
(PESOS)

HOJA: 1 DE: 4		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
4	OCTUBRE	2018

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESTUDIO "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO PARA USO PÚBLICO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA NORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	280410001	VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 9,998,222.12	\$ 4,999,111.06	0.00	0.00	Autorizado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1	0
Licitado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00																	
Contratado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00																	
Físico	5,998,933.27	2,999,466.63	2,999,466.64	0.00	0.00	0.00																	
Financiero	3,979,869.23	1,989,934.61	1,989,934.62	0.00	0.00	0.00																	
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A CIUDAD VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 9,885,515.56	\$ 4,942,757.78	0.00	0.00	Autorizado	9,885,515.56	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
Licitado	9,885,515.56	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00																	
Contratado	9,885,515.56	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00																	
Físico	8,501,543.38	4,250,771.69	4,250,771.69	0.00	0.00	0.00																	
Financiero	6,490,060.13	3,245,030.08	3,245,030.05	0.00	0.00	0.00																	
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (VAEAS), CON VALVULAS DE AIRE COMBINADAS DE NUEVA GENERACIÓN, EN EL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 7,542,828.51	\$ 3,771,414.26	0.00	0.00	Autorizado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
Licitado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00																	
Contratado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00																	
Físico	1,734,850.56	867,425.28	867,425.28	0.00	0.00	0.00																	
Financiero	2,669,442.43	1,334,721.21	1,334,721.22	0.00	0.00	0.00																	
4	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIRE EN OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE REBOMBEO No.1 Y No.2, DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 2,612,697.94	\$ 1,306,348.97	0.00	0.00	Autorizado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
Licitado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00																	
Contratado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00																	
Físico	2,273,047.21	1,136,523.60	1,136,523.61	0.00	0.00	0.00																	
Financiero	1,375,592.57	687,796.28	687,796.29	0.00	0.00	0.00																	
TOTAL									\$ 30,039,264.13	\$ 15,019,632.07					14,514,964.36	7,257,482.18	7,257,482.18	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
GOLFO NORTE

RUBEN QUIROGA PEÑA

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador		
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
5	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE 1.5 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 17,399,999.95	\$ 8,699,999.98	0.00	0.00	Autorizado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305.551	0
														Licitado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00			
														Físico	16,529,999.95	8,264,999.97	8,264,999.98	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	14,498,748.21	7,249,374.11	7,249,374.10	0.00	0.00	0.00			
6	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESCUELA DEL AGUA. CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES		VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPANTES	0	0
														Licitado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,050,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
7	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUÍFERO 2807 VICTORIA - GUEMEZ LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA		VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 6,250,318.18	\$ 3,000,152.73	0.00	0.00	Autorizado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1	0
														Licitado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Físico	625,031.82	300,015.27	325,016.55	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,562,579.54	750,038.18	812,541.36	0.00	0.00	0.00			
8	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS Y LINEAS DE INTERCONEXIÓN DEL CG-184 "CONSTRUCCIÓN DEL ACUAFERICO" A LINEAS PRINCIPALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE MACROMEDICIÓN EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA CIUDAD DE VICTORIA, TAMAULIPAS.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 3,608,240.42	\$ 1,804,120.21	0.00	0.00	Autorizado	3,608,240.42	1,804,120.21	1,804,120.21	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	892.3	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL										\$ 28,788,558.55	\$ 14,254,272.92				17,561,327.75	8,749,412.29	8,811,915.46	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
GOLFO NORTE

RUBÉN QUIROGA PEÑA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
(PESOS)

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

HOJA: 4		DE: 4	
FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
4	OCTUBRE	2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
11	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MORELIA CON UNA LONGITUD DE 808 ML CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM DE DIÁMETRO, PARA CONECTAR EL COLECTOR GUATEMALA CON LA ESTACIÓN DE BOMBEO LUCIO BLANCO Y CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN AL DEJAR DE VERTER 600 LPS DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS AL RÍO PÁNUCO, EN CD. MADERO, TAM.	28009001	MADERO	MADERO	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 8,344,543.65	\$ 4,172,271.82	0.00	0.00	Autorizado	8,344,543.65	4,172,271.82	4,172,271.83	0.00	0.00	0.00	M.L	608	0
														Licitado	8,344,543.65	4,172,271.82	4,172,271.83	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	8,344,543.65	4,172,271.82	4,172,271.83	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	2,503,363.09	1,251,681.54	1,251,681.55	0.00	0.00	0.00			
12	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	EQUIPO DE PRESIÓN Y VACÍO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS		VARIOS	VARIOS	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 7,535,360.00	\$ 3,767,680.00	0.00	0.00	Autorizado	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0
														Licitado	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL									\$ 15,879,903.65	\$ 7,939,951.82				2,503,363.09	1,251,681.54	1,251,681.55	0.00	0.00	0.00				

Autorizado	114,480,003.38	57,114,995.32	57,365,008.07	0.00	0.00	0.00
Licitado	71,069,485.91	35,409,736.59	35,659,749.33	0.00	0.00	0.00
Contratado	71,069,485.91	35,409,736.59	35,659,749.33	0.00	0.00	0.00
Físico	44,248,766.19	22,111,882.44	22,136,883.75	0.00	0.00	0.00
Financiero	34,579,655.20	17,258,576.01	17,321,079.19	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
GOLFO NORTE

RUBEN QUIROGA PEÑA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
(PESOS)

HOJA: 1 DE: 5		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
4	OCTUBRE	2018

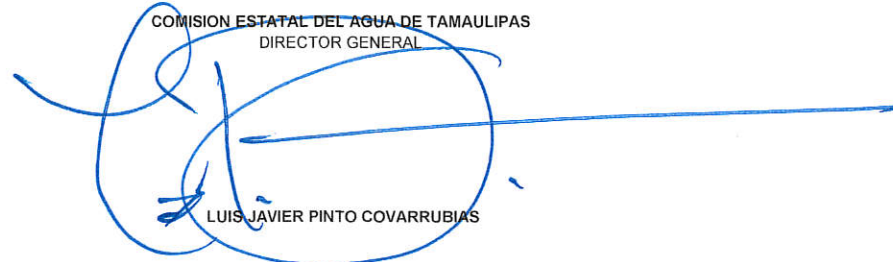
ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 24" DE DIÁMETRO (INTERCONEXIÓN A RED GENERAL.) PARA LA RECUPERACIÓN DEL DESABASTO DE AGUA POTABLE, CON LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE 100 LPS, EN LA ESTACIÓN DE REBOMBEO RÍO PURIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 2,861,227.01	\$ 1,430,613.50	0.00	0.00	Autorizado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	3	0
														Licitado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	858,368.10	429,184.05	429,184.05	0.00	0.00	0.00			
3	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 4); EN LA ZONA SUR, COL. LOS OLIVOS (ETAPA ÚNICA), EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, CON UNA LONGITUD DE 3,396 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 4,453,738.61	\$ 2,226,869.30	0.00	0.00	Autorizado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00	M.L	3396	0
														Licitado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	45	0
														Contratado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,692,420.67	846,210.33	846,210.34	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	235	0
														Financiero	1,336,121.58	668,060.79	668,060.79	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 7,314,965.62	\$ 3,657,482.80				2,194,489.88	1,097,244.84	1,097,244.84	0.00	0.00	0.00
-------	-----------------	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL



LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA RIO BRAVO

LUIS FERNANDO UC NAJERA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
(PESOS)


HOJA: 2 DE: 6		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
4	OCTUBRE	2018

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
4	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 4); EN LA COLONIA JUAN RODRIGUEZ, EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 2,638 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO, 31 POZOS DE VISITA Y 97 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 2,564,016.07	\$ 1,282,008.03	0.00	0.00	Autorizado	2,564,016.07	1,282,008.03	1,282,008.04	0.00	0.00	0.00	M.L	2638	0
														Licitado	2,564,016.07	1,282,008.04	1,282,008.04	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	31	0
														Contratado	2,564,016.07	1,282,008.03	1,282,008.04	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	97	0
														Físico	461,522.89	230,761.44	230,761.45	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	769,204.82	384,602.41	384,602.41	0.00	0.00	0.00			
6	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); EN LA COL. AGRÍCOLA ORIENTAL EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS, CON UNA LONGITUD DE 7,946 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS, 101 POZOS DE VISITA Y 610 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 11,900,832.50	\$ 5,950,416.25	0.00	0.00	Autorizado	11,900,832.50	5,950,416.25	5,950,416.25	0.00	0.00	0.00	M.L	7946	0
														Licitado	11,900,832.50	5,950,416.25	5,950,416.25	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	101	0
														Contratado	11,900,832.50	5,950,416.25	5,950,416.25	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	610	0
														Físico	2,023,141.53	1,011,570.76	1,011,570.77	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	3,570,249.75	1,785,124.88	1,785,124.87	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 14,464,848.57	\$ 7,232,424.28				4,339,454.57	2,169,727.29	2,169,727.28	0.00	0.00	0.00
-------	------------------	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

LUIS FERNANDO UC NAJERA


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
(PESOS)

HOJA: 4 DE: 5		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
4	OCTUBRE	2018

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
10	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	AMPLIACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No. X1; CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A GRAVEDAD LAS VACAS CON UNA LONGITUD DE 1+780 AL 3+700 (1,920 ML) CON TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO Y PVC CORRUGADO DE 36" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL, INCLUYE 18 POZOS DE VISITA, EN MATAMOROS, TAM.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 17,045,678.71	\$ 8,522,839.35	0.00	0.00	Autorizado	17,045,678.71	8,522,839.35	8,522,839.36	0.00	0.00	0.00	M.L	1920	0
														Licitado	17,045,678.71	8,522,839.35	8,522,839.36	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	17,045,678.71	8,522,839.35	8,522,839.36	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	5,113,703.61	2,556,851.81	2,556,851.80	0.00	0.00	0.00			
11	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	AMPLIACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No. X1; CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A GRAVEDAD LAS VACAS CON UNA LONGITUD DE 3+700 AL 5+620 (1,920 ML) CON TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO Y PVC CORRUGADO DE 36" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL, INCLUYE 17 POZOS DE VISITA, EN MATAMOROS, TAM.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 15,750,938.85	\$ 7,875,469.42	0.00	0.00	Autorizado	15,750,938.85	7,875,469.42	7,875,469.43	0.00	0.00	0.00	M.L	1920	0
														Licitado	15,750,938.85	7,875,469.42	7,875,469.43	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	15,750,938.85	7,875,469.42	7,875,469.43	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	4,725,281.66	2,362,640.83	2,362,640.83	0.00	0.00	0.00			
TOTAL									\$ 32,796,617.56	\$ 16,398,308.77				9,838,985.27	4,919,492.64	4,919,492.63	0.00	0.00	0.00				

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA RIO BRAVO

LUIS FERNANDO UC NAJERA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
(PESOS)

HOJA: 5 DE: 5		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
4	OCTUBRE	2018

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador								
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
13	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); EN LA COL. JOSÉ TEJEDA EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 3,300 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS, 42 POZOS DE VISITA Y 214 DESCARGAS DOMICILIARIAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 4,700,000.08	\$ 2,350,000.03	0.00	0.00	Autorizado	4,700,000.08	2,350,000.03	2,350,000.03	0.00	0.00	0.00	M.L	3300	0					
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				POZO DE VISITA	42	0		
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGA							214	0
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
14	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 2); EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR REAL DE 14) DEL 0+000 AL 2+038 CON TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 30 POZOS DE VISITA. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 9,009,437.32	\$ 4,504,718.66	0.00	0.00	Autorizado	9,009,437.32	4,504,718.66	4,504,718.66	0.00	0.00	0.00	M.L	2038	0					
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA				30	0			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
16	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, CON UNA LONGITUD DE 956.61 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS, 11 POZOS DE VISITA Y 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA ZONA MAQUILADORA DE NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280140001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 1,900,000.00	\$ 950,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,900,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	M.L	956.6	0					
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
TOTAL										\$ 13,709,437.38	\$ 6,854,718.69				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Autorizado	90,637,323.42	45,318,661.68	45,318,661.74	0.00	0.00	0.00
Licitado	75,027,886.04	37,513,943.00	37,513,943.05	0.00	0.00	0.00
Contratado	75,027,886.04	37,513,942.99	37,513,943.05	0.00	0.00	0.00
Físico	10,489,489.42	5,244,744.69	5,244,744.72	0.00	0.00	0.00
Financiero	22,508,365.82	11,254,182.91	11,254,182.91	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

LUIS FERNANDO UC NAJERA
