

Febrero 06, 2026

Oficio Núm.
SRHDS/0194/2026

Página 1 de 1

**ING. JAIME FELIPE
CANO PEREZ**

Encargado del Despacho
de la Dirección General
del Organismo de Cuenca
Golfo Norte de la
CONAGUA

Presente.

Asunto: **Reporte de Avances actualizado al mes de enero 2026 del PROAGUA 2025.**

Referente al oficio No. OCGN/B00.804.06.-753/2025 de fecha 30 de junio del 2025, en el cual solicita el "Reporte de Avances" del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 2025, específicamente a lo establecido en el numeral 3.9 Obligaciones y sanciones, 3.9.1. Obligaciones de los beneficiarios, k).- Enviar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes a la Dirección de la CONAGUA en forma impresa y digital el reporte de avances físico-financiero de las acciones de Infraestructura. Por lo anterior, envió el informe arriba señalado con corte al mes de enero 2026.



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ
Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

(con anexos)

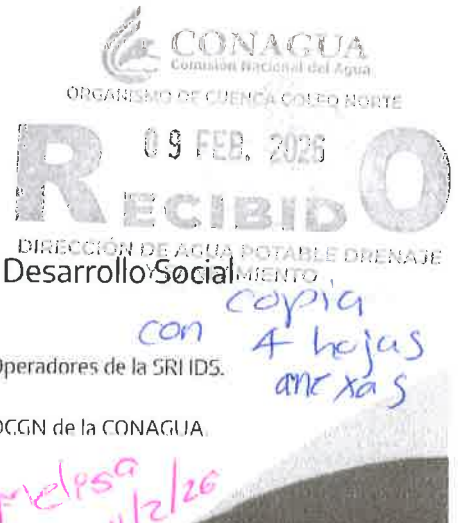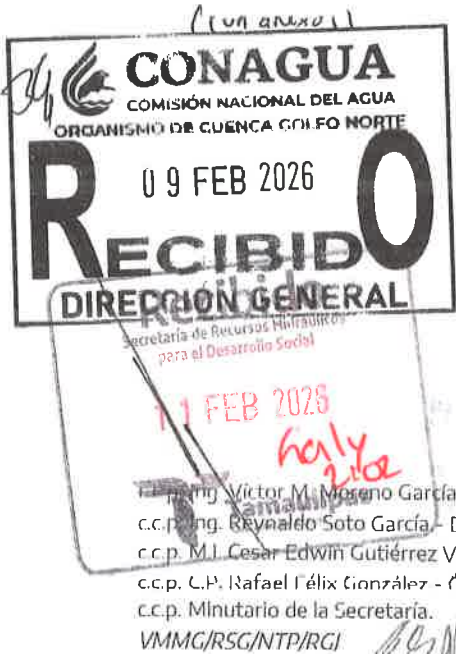

- Ing. Víctor M. Moreno García.- Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la SRI IDS.
- c.c. Ing. Reynaldo Soto García.- Director de Agua Potable y Saneamiento de la SRHDS.
- c.c.p. M.I. Cesar Edwin Gutiérrez Valencia.- Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del OCGN de la CONAGUA.
- c.c.p. C.P. Rafael Félix González - Órgano de Control de la SRHDS.
- c.c.p. Minutario de la Secretaría.
- VMMG/RSG/NTP/RGI

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."





Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
6	Febrero	2026

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Reporte correspondiente al mes de:

Enero 2026

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación						Financiero		Avances					
				Código Contrato	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
25R281	Abasolo	Guadalupe Victoria	Estudio y proyecto integral de agua potable y alcantarillado y saneamiento en la Localidad de Guadalupe Victoria del Municipio de Abasolo Tamaulipas	E-2025-00060214	Invitación a cuando menos tres personas	18-ago-2025	SOP-IF-PE-061-25-I	04-sep-2025	30-dic-2025	1,210,859.81	2,421,719.62	100.00%	0.00%	100.00%	2,421,719.62	0.00	2,421,719.62
25R282	Victoria	Santa Clara	Construcción del sistema de saneamiento básico en la Localidad de Santa Clara Municipio de Victoria, Tamaulipas.	E-2025-00059231	Invitación a cuando menos tres personas	17-sep-2025	SOP-IF-AS-086-25-I	02-oct-2025	28-feb-2026	2,946,200.35	5,892,400.70	46.00%	27.00%	73.00%	4,707,650.54	0.00	4,707,650.54
25R283	Casas	Jacinto Canek	Construcción del sistema de saneamiento básico en el Ejido Jacinto Canek, Municipio de Casas, Tamaulipas.	E-2025-00059758	Invitación a cuando menos tres personas	20-ago-2025	SOP-IF-AS-066-25-I	04-sep-2025	28-feb-2026	2,928,795.50	5,857,591.00	52.00%	24.00%	76.00%	4,550,990.00	0.00	4,550,990.00
25U287	Altamira	Altamira	Ampliación de la Planta Potabilizadora Duport de 800 a 1000 lps en el Municipio de Altamira Tamaulipas (Primera de Tres Etapas)	E-2025-00058713	Invitación a cuando menos tres personas	26-sep-2025	SOP-IF-AP-096-25-I	10-oct-2025	31-mar-2026	12,514,667.07	31,286,667.68	6.90%	28.10%	35.00%	11,652,843.38	0.00	11,652,843.38
25U288	Tampico	Tampico	Obra para Reposición de Línea de Agua Potable con Tubería de Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio en la Col. Niños Héroes en Tampico, Tam.	E-2025-00059846	Invitación a cuando menos tres personas	23-oct-2025	SOP-IF-AP-157-25-I	07-nov-2025	31-mar-2026	14,464,537.12	36,161,342.78	7.80%	32.20%	40.00%	12,076,520.30	0.00	12,076,520.30
25U289	Victoria	Victoria	Rehabilitación de Red de Agua Potable con Tubería de acero de 30" de Diámetro en Cruce de Río San Marcos de C. Tula con Boulevard Praxedis Balboa a c. Blasquel Coppel Col. Moderna en Cd Victoria	E-2025-00058695	Invitación a cuando menos tres personas	24-sep-2025	SOP-IF-AP-087-25-I	02-oct-2025	28-feb-2026	3,483,989.16	11,579,812.01	55.00%	28.00%	83.00%	9,431,537.48	0.00	9,431,537.48
25U2810	Victoria	Victoria	Obra para Reubicación de Línea de Alimentación de Tamatan a Cofrades de 18" de Diámetro en Calle Ursulo Galvan entre Lib. Emilio Portes Gil y C. Avenida Seferino Morales, Cd. Victoria	E-2025-00059793	Invitación a cuando menos tres personas	15-ago-2025	SOP-IF-AP-060-25-I	30-ago-2025	27-dic-2025	975,355.11	2,882,460.57	100.00%	0.00%	100.00%	2,437,219.31	0.00	2,437,219.31
25U2811	Soto la Marina	Soto la Marina	Actualización del Proyecto Integral del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para la Cabecera Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas.	E-2025-00059737	Invitación a cuando menos tres personas	15/08/2025	SOP-IF-SE-059-25-I	30-ago-2025	27-dic-2025	1,860,350.03	3,720,700.06	100.00%	0.00%	100.00%	3,720,700.05	0.00	3,720,700.05
25U2812	Varios	Varias	Fortalecimiento de Capacidades.	N/A	Adjudicación Directa	03-jul-2025	SRHDS/001/2025	10-sep-2025	07-nov-2025	1,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	0.00%	100.00%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00






Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
6	Febrero	2026

Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Reporte correspondiente al mes de:

Enero 2026

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación						Avances							
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
25U2813	Tampico	Tampico	Construcción de Colector Marginal Tancol con Tubería PEAD Corrugada de 12" hasta 24" de ø, entre Calle Revolución y caja de Llegada del Cárcamo Tancol 1 Norte en la calle 6 de Enero en las Colonias Tancol y la Paz, Tampico, Tamaulipas.	E-2025-00090394	Adjudicación Directa	19-nov-2025	SOP-IF-AS-222-25-D	05-ene-2025	31-mar-2026	6,909,115.70	17,272,789.24	0.00%	33.00%	33.00%	5,181,836.78	0.00	5,181,836.78
25R2819	González	Ejido Santa Fe	Perforación de pozo profundo en la Localidad de Santa Fe del Municipio de González	E-2025-00087148	Adjudicación Directa	19-nov-2025	SOP-IF-AP-224-25-D	01-ene-2025	31-mar-2026	2,138,820.27	4,308,399.67	20.00%	79.00%	99.00%	1,292,519.90	0.00	1,292,519.90
25R2820	Casas	Buenavista	Perforación de pozo profundo en la Localidad de Buenavista del Municipio de Casas	E-2025-00087148	Adjudicación Directa	19-nov-2025	SOP-IF-AP-224-25-D	01-ene-2025	31-mar-2026	2,534,548.03	4,224,246.72	0.00%	9.50%	9.50%	1,267,274.02	0.00	1,267,274.02
25R2821	San Fernando	Alfredo V. Bonfil	Reposición de pozo profundo en la Localidad de Alfredo V. Bonfil del Municipio de San Fernando.	E-2025-00104975	Invitación a cuando menos tres personas	19-nov-2025	SOP-IF-AP-223-25-I	05-ene-2025	31-mar-2026	1,868,510.77	3,555,037.49	5.00%	20.00%	25.00%	1,186,511.24	0.00	1,186,511.24

NOTA:

Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Moreno García
Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la SRHDS

Aprobó:

Ing. Raúl Quiroga Álvarez
Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social
