



**RAMO 033**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS**  
 OBRAS Y ACCIONES  
 PRIMER TRIMESTRAL 2018  
 FECHA: 30 DE MARZO DEL 2018

TECHO FINANCIERO: \$117,263,607

No. DE PROYECTO	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
18-2506-01		VARIOS MUNICIPIOS		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	\$89,608,332.04	\$89,608,332.04	\$89,608,332.04	CUARTO	1,061.00			VIVIENDA	1,061	0.00%	0.00%
18-2597-01		VARIOS MUNICIPIOS		CONSTRUCCIÓN DE 337 TECHOS FIRMES Y 167 PISOS FIRMES	\$9,556,952.26	\$9,556,952.26	\$9,556,952.26	OBRA	504.00			VIVIENDA	504	0.00%	0.00%
18-2598-01		GÓMEZ FARÍAS		REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	\$1,218,957.02	\$1,218,957.02	\$1,218,957.02	ML	1,000.00			VIVIENDA	239	0.00%	0.00%
18-2598-01		GÓMEZ FARÍAS		REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. RANCHO SAN FRANCISCO	\$812,501.22	\$812,501.22	\$812,501.22	OBRA	1.00			VIVIENDA	135	0.00%	0.00%
		LLERA		EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD	\$3,926,719.16	\$3,926,719.16	\$3,926,719.16	EQUIPAMIENTO	1.00			VIVIENDA	140	0.00%	0.00%
		REYNOSA		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	\$9,384,451.07	\$9,384,451.07	\$6,193,737.71	ML	524.00			VIVIENDA	6,755	0.00%	0.00%
		VICTORIA		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN. COLONIA AGUSTIN ESQUEDA	\$902,661.91	\$902,661.91	\$902,661.91	POSTE	15.00			VIVIENDA	54	0.00%	0.00%
		VARIOS MUNICIPIOS		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	LÁMPARAS	250.00			VIVIENDA	1,080	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>					<b>\$116,610,574.68</b>	<b>\$116,610,574.68</b>	<b>\$113,419,861.32</b>						<b>9,968</b>		

ELABORÓ  
  
 LIC. ÉRIKA BRISA ZAMARRIPA MONDRAGÓN  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REPORTE

Vp.Bo.  
  
 C.P. ROMULO GARZA MARTÍNEZ  
 COORDINADOR TÉCNICO Y DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS



**RAMO 033**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS**  
 OBRAS Y ACCIONES  
 SEGUNDO TRIMESTRAL 2018  
 FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2018

TECHO FINANCIERO: \$117,263,607

No. DE OBRA	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS			PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.	
18-2596-01		VARIOS MUNICIPIOS		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	\$89,608,332.04	\$89,608,332.04	\$89,608,332.04	CUARTO	1,061.00			VIVIENDA	1,061	0.00%	0.00%	
18-2597-01		VARIOS MUNICIPIOS		CONSTRUCCIÓN DE 337 TECHOS FIRMES Y 167 PISOS FIRMES	\$9,556,952.26	\$9,556,952.26	\$9,556,952.26	OBRA	504.00			VIVIENDA	504	0.00%	0.00%	
18-2599-01		GÓMEZ FARIAS		REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	\$1,218,957.02	\$1,218,957.02	\$1,218,957.02	ML	1,000.00			VIVIENDA	239	0.00%	0.00%	
18-2598-01		GÓMEZ FARIAS		REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. RANCHO SAN FRANCISCO	\$812,501.22	\$812,501.22	\$812,501.22	OBRA	1.00			VIVIENDA	135	0.00%	0.00%	
		LLERA		EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD	\$3,926,719.16	\$3,926,719.16	\$3,926,719.16	EQUIPAMIENTO	1.00			VIVIENDA	140	0.00%	0.00%	
		REYNOSA		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	\$9,384,451.07	\$9,384,451.07	\$6,193,737.71	ML	524.00			VIVIENDA	6,755	0.00%	0.00%	
		VICTORIA		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN. COLONIA AGUSTIN ESQUEDA	\$902,661.91	\$902,661.91	\$902,661.91	POSTE	15.00			VIVIENDA	54	0.00%	0.00%	
		VARIOS MUNICIPIOS		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	LÁMPARAS	250.00			VIVIENDA	1,080	0.00%	0.00%	
<b>TOTAL</b>					<b>\$116,610,574.68</b>	<b>\$116,610,574.68</b>	<b>\$113,419,861.32</b>						<b>9,968</b>			

ELABORÓ  
  
 LIC. ÉRIKA BRISA ZAMARRIPA MONDRAGÓN  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REPORTE


Vo.Bo.  
  
 C.P. FÓMULO GARZA MARTÍNEZ  
 COORDINADOR TÉCNICO Y DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS

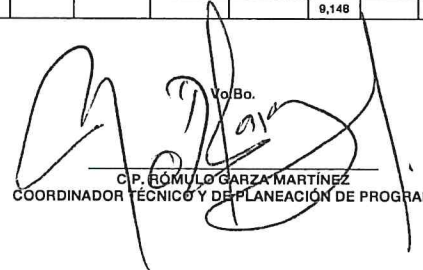


**RAMO 033**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS**  
 OBRAS Y ACCIONES  
 TERCER TRIMESTRAL 2018  
 FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2018

TECHO FINANCIERO: \$117,263,607

No. DE PROYECTO	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
18-2506-01	SOP-IF-EEP-008-18-P	VARIOS MUNICIPIOS	Proyectos y Construcciones Río Norte S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	\$89,608,325.28	\$89,608,325.28	\$89,608,325.28	CUARTO	1,061.00	13/07/2018	12/12/2018	VIVIENDA	1,061	12.60%	41.00%
18-2597-01		VARIOS MUNICIPIOS		CONSTRUCCIÓN DE 337 TECHOS FIRMES Y 167 PISOS FIRMES	\$14,276,059.49	\$14,276,059.49	\$14,276,059.49	OBRA	504.00			VIVIENDA	504	0.00%	0.00%
18-2599-01		GÓMEZ FARÍAS		REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	\$1,218,957.02	\$1,218,957.02	\$1,218,957.02	ML	1,000.00			VIVIENDA	239	0.00%	0.00%
18-2598-01		GÓMEZ FARÍAS		REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. RANCHO SAN FRANCISCO	\$812,501.22	\$812,501.22	\$812,501.22	OBRA	1.00			VIVIENDA	135	0.00%	0.00%
		LLERA		EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD	\$3,026,719.16	\$3,026,719.16	\$3,026,719.16	EQUIPAMIENTO	1.00			VIVIENDA	140	0.00%	0.00%
		REYNOSA		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	\$9,384,451.07	\$9,384,451.07	\$6,193,737.71	ML	524.00			VIVIENDA	6,755	0.00%	0.00%
18-2932-01		VICTORIA		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN. COLONIA AGUSTIN ESQUEDA	\$902,661.91	\$902,661.91	\$902,661.91	POSTE	15.00			VIVIENDA	54	0.00%	0.00%
18-2933-01		VARIOS MUNICIPIOS		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$324,645.12	\$324,645.12	\$324,645.12	LÁMPARAS	65.00			VIVIENDA	260	0.00%	0.00%
TOTAL					\$120,454,320.27	\$120,454,320.27	\$117,263,606.01						9,148		

ELABORÓ  
  
 LIC. ÉRIKA-BRISA ZAMARRIPA-MONDRAGÓN  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REPORTE

Vo.Bo.  
  
 C.P. RÓMULO GARZA MARTÍNEZ  
 COORDINADOR TÉCNICO Y DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS
