



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
 OBRAS Y ACCIONES
 CUARTO TRIMESTRAL 2018
 FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TECHO FINANCIERO: \$117,263,607


No. DE PROYECTO	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
18-2596-01	SOP-IF-EEP-098-18-P	VARIOS MUNICIPIOS	Proyectos y Construcciones Río Norte S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	\$89,608,325.28	\$89,608,325.28	\$89,608,325.28	CUARTO	1,061.00	13/07/2018	15/03/2019	VIVIENDA	1,061	44.80%	77.13%
18-2597-01	SOP-IF-EEP-163-18-P	VARIOS MUNICIPIOS	Proyectos y Construcciones Río Norte S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE 337 TECHOS FIRMES Y 167 PISOS FIRMES	\$14,276,059.49	\$14,276,059.49	\$14,276,059.49	OBRA	504.00	17/10/2018	15/03/2019	VIVIENDA	504	0.00%	30.00%
18-2599-01	SOP-IF-AP-238-18-I	GÓMEZ FARÍAS	Instrumentos y Equipos BERMAN S.A. de C.V.	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	\$1,218,957.02	\$1,218,957.02	\$1,218,957.02	ML	1,000.00	18/12/2018	17/03/2019	VIVIENDA	239	0.00%	30.00%
18-2598-01	SOP-IF-AP-238-18-I	GÓMEZ FARÍAS	Instrumentos y Equipos BERMAN S.A. de C.V.	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. RANCHO SAN FRANCISCO	\$812,501.22	\$812,501.22	\$812,501.22	OBRA	1.00	18/12/2018	17/03/2019	VIVIENDA	135	0.00%	30.00%
18-3038-01		LLERA		EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD	\$3,926,719.16	\$3,926,719.16	\$3,926,719.16	EQUIPAMIENTO	1.00			VIVIENDA	140	0.00%	0.00%
18-2934-01	SOP-IF-AS-214-18-P	REYNOSA	P.E.C.A. Transporte y Construcción, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	\$9,384,451.07	\$9,384,451.07	\$6,193,737.71	ML	524.00	13/12/2018	15/03/2019	VIVIENDA	6,755	0.00%	30.00%
18-2932-01	9400096539	VICTORIA	Multiservicios y Suministros González S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN. COLONIA AGUSTIN ESQUEDA	\$902,661.91	\$902,661.91	\$902,661.91	POSTE	15.00	01/10/2018	15/12/2018	VIVIENDA	54	100.00%	100.00%
18-2933-01		VARIOS MUNICIPIOS	Tecnologías y Suministros del Golfo S.A. de C.V.	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$324,645.12	\$324,645.12	\$324,645.12	LÁMPARAS	65.00	01/12/2018	15/02/2019	VIVIENDA	260	50.00%	100.00%
TOTAL					\$120,454,320.27	\$120,454,320.27	\$117,263,606.91						9,148		

ELABORÓ



LIC. ÉRIKA BRISA ZAMARRIPA MONDRAGÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REPORTE

Vo.Bo

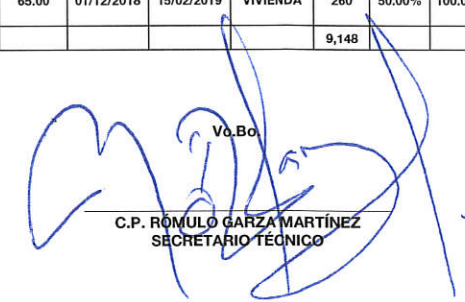

C.P. RÓMULO GARZA MARTÍNEZ
 SECRETARIO TÉCNICO
